

MORSANO AL TAGLIAMENTO (scala 1:1000)




MORSANO AL TAGLIAMENTO (scala 1:200)



MORSANO AL TAGLIAMENTO (scala 1:1000)

SEGNALETICA DI SICUREZZA E PRESIDI DI CANTIERE

BAGNO CHIMICO DI EMERGENZA E PER CANTIERE

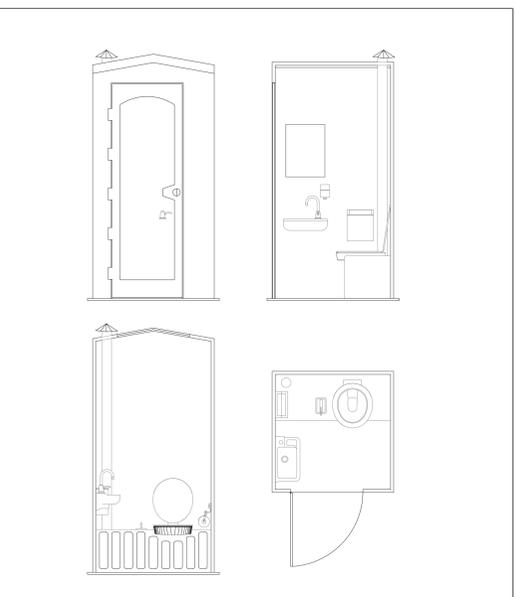

Per segnalare i RISCHI DI URTO CONTRO OSTACOLI E/O PUNTI DI PERICOLO si usa il nastro giallo/alternato di nero ovvero il rosso/alternato di bianco

Simbolo	Descrizione
	Perimetro area magazzini comunali
	Recinzione di cantiere in rete plastificata H=200cm
	Accesso e uscita area di cantiere
	Spazio riservato a deposito/logistica di cantiere
	Ingresso carrabile/pedonale
	Box servizi
	Carico - scarico
	Deposito/Stoccaggio materiali
	Simbolo generico riferimento cantiere

Forma geometrica	Significato
	Divieto e prescrizione
	Avvertimento
	divulgazione informazione e complementare

Colore	Significato o scopo
ROSSO	Segnali di divieto - Allarme - pericolo Materiale ed attrezzature antincendio
GIALLO	Segnali di avvertimento
VERDE	Situazione di sicurezza segnali di salvataggio o di soccorso
AZZURRO	Segnali di prescrizione

PRESCRIZIONI GENERALI

- Tutti i lavoratori impegnati nel cantiere dovranno essere forniti di cartellini che ne identifichino l'identità e l'impresa per cui lavorano
- I veicoli e i mezzi d'opera devono procedere a velocità moderata, prestando attenzione agli altri veicoli ed ai pedoni
- Accertarsi che la recinzione di cantiere sia sufficientemente robusta e munita di lampeggiatori crepuscolari
- Verificare in loco la posizione esatta dei sottoservizi da rimuovere e da mantenere prima di effettuare gli scavi; disattivare/sezionare gli impianti prima di iniziare le lavorazioni; si fa divieto di accumulare materiale sul ciglio scavo.
- Sarà cura dell'impresa affidataria organizzare e mantenere operativo il servizio di emergenza, avvalendosi di idoneo personale addetto; dovrà garantire la presenza di personale idoneo e dovrà assicurarsi che tutte le persone presenti in cantiere siano informate delle procedure di emergenza
- Ogni impresario dovrà essere munito di cassetta di pronto soccorso, ed estintore da disporre vicino alle zone di rischio.
- La segnaletica impiegata dovrà essere conforme agli allegati da XXIV a XXVII del D.Lgs.81/2008 in particolare per tipo e dimensione; si faccia riferimento al specifico elaborato allegato al PSC
- Tutti gli impianti di cantiere devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte, muniti di dichiarazione di Conformità rilasciata da ditta abilitata
- I materiali e le attrezzature dovranno essere disposti o accostati in modo da evitare il crollo o il ribaltamento
- I materiali rimossi e tutto il materiale di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere il prima possibile e trasportati in discarica autorizzata o in apposito centro di stoccaggio
- Nella fase di movimentazione di carichi accertarsi di non far sporgere il carico fuori dalla recinzione, i carichi devono essere movimentati solo nell'area circoscritta del cantiere ed in modo da evitare il passaggio sopra i lavoratori
- Le macchine presenti in cantiere dovranno essere provviste di appositi libretti di istruzione e marchiatura CE, quando previsto dovranno essere mantenute secondo le disposizioni di legge, i macchinari dovranno essere muniti di girofaro.
- Gli spazi 1-2-3-4 possono essere individuati con l'accordo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
- Disattivare gli impianti prima di procedere con demolizioni e rimozioni
- Non lasciare incustoditi gli scavi, delimitare sempre i lavori da effettuarsi in sede stradale posando la segnaletica, gli addetti indosseranno sempre indumenti ad alta visibilità
- Sarà cura dell'impresa affidataria garantire che la circolazione dei lavoratori e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro all'interno del cantiere; per tutta la durata dei lavori l'impresa dovrà garantire una continua pulizia del cantiere e della sede stradale promiscua. L'accesso/uscita dei mezzi dal cantiere sarà regolato obbligatoriamente da moviere a terra, per facilitare le operazioni di ingresso/uscita
- IL PRESENTE PSC DEVE ESSERE ESAMINATO IN TEMPO UTILE PRIMA DELL'INIZIO LAVORI DA CASCUNA IMPRESA ESECUTTRICE; TALI IMPRESE, SULLA BASE DI QUANTO QUI INDIRIZZATO E DELLE LORO SPECIFICHE ATTIVITÀ, REDIGONO E FORNISCONO AL CSE, PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI IL LORO SPECIFICO POS. SOLO DOPO L'AUTORIZZAZIONE DEL CSE L'IMPRESA POTRÀ INIZIARE LA LAVORAZIONE.
- In cantiere dovrà essere esposta la Notifica Preliminare, il Cartello di cantiere, i Numeri utili di riferimento per il cantiere nonché la procedura da adottare in caso di emergenza
- In cantiere sarà garantita la presenza di acqua potabile in quantità sufficiente;
- In cantiere dovrà essere conservata tutta la documentazione prevista per legge e richiesto dal CSE; tale documentazione dovrà essere tenuta in ordine o disposizione dei Organi preposti alla Vigilanza
- Gli aggiornamenti del PSC e del layout di cantiere sono a cura del CSE, anche su indicazione e sulle effettive necessità organizzative dell'impresa

COMMITTENTE
COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO
Piazza Daniele Moro, 33
33075 - Morsano al Tagliamento (PN)

TITOLO
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EFFICIENTAMENTO ENERGETICO) IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE.
VIA CENTRO E VIA PRINCIPALE. CUP: I94H23000010006.
M2C4I2.2 LEGGE N. 160 DEL 27.12.2019 ART. 1 COMMA 29 LETT. A) E B).

LIVELLO DI PROGETTO
PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO ELABORATO
Layout di cantiere
E-9.5
SCALA/E

LIVELLO
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI PORDENONE
COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO

COMMESSA
23016
FILE
23016E95TAVGR

PROGETTISTA
Michele Per. Ind. Modolo

COLLABORATORI
Lorenzo Pavanetto

PROGETTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI

PROGETTO

DATA	REVISIONE	OGGETTO/MODIFICHE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
31/07/2023	00	Emissione	MM	MM	MM

PROGECO

RETE DI PROFESSIONISTI TRIESTE
Michele Per. Ind. Modolo
Via Trieste 2, 33075 Morsano (PN)
Phone +39 0434 570007
Email info@progecoind.com
Web: www.progecoind.com

PROGETTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI

SETTORI DI INTERVENTO

- IE - IMPIANTI ELETTRICI
- IM - IMPIANTI MECCANICI
- PI - PREVENZIONE INCENDI
- ID - INFRASTRUTTURE IDRAULICHE
- IP - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- IS - ILLUMINAZIONE SCENOGRAFICA
- IA - ACUSTICA
- CS - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

PROTEZIONE CIVILE
COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO
N. 973

COLLABORATORI
Lorenzo Pavanetto

A sensi degli artt. 2043 - 2048 - 2049 c.c. e degli artt. 622 - 623 c.p. è vietata la riproduzione e l'uso del presente elaborato senza la nostra autorizzazione scritta.
