REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL CORPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - 2° STRALCIO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

1 DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA

1.09 CRONOPROGRAMMA

REVISIONI	DATA	OGGETTO	REDATTO DA	VERIFICATO DA
4	.	.	.	.
3	.	.	.	.
2	.	.	.	.
1	.	.	.	.
0	AGOSTO 2018	EMISSIONE	Geom. I. Sarcinelli	Dott. ing. P. Truant

PROGETTISTA : Dott. Ing. Pierino TRUANT

TRUANT & ASSOCIATI SNC
Dott. Ing. Pierino TRUANT / Per. Ind. Ed. Mauro BERTUZZI / Geom. Walter MARCUZZI
Via Corridoni 9 - 33097 SPILIMBERGO (PN)
tel. 0427/41333 - fax 0427/51166
E-mail: info@truantassociati.it

CRONOPROGRAMMA

Il cronoprogramma che segue, redatto ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 207/2010, è stato suddiviso per microfasi lavorative considerando squadre tipo ipotizzabili per la realizzazione degli interventi.

Sono stati previsti per la realizzazione dell'opera n. 150 (centocinquanta) giorni naturali, successivi e continui così suddivisi (sono previste sovrapposizioni di lavorazioni):

- opere edili gg 50
- opere strutturali gg 10
- opere di finitura gg 40
- serramenti gg 15
- impianto idrico e sanitario gg 15
- impianto termico e di climatizzazione gg 15
- impianto elettrico gg 20

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole e dei giorni non lavorativi.

Il cronoprogramma potrà subire delle variazioni durante il corso delle lavorazioni, sia per sospensioni, sia per modifiche nella realizzazione delle fasi lavorative determinate da diversi fattori quali utilizzo di attrezzature particolari o l'incontro di problematiche non previste etc.

Pertanto il documento andrà costantemente aggiornato e all'inizio di ogni settimana lavorativa dovrà essere redatto un verbale di concordamento delle lavorazioni da eseguire sottoscritto dal Direttore dei lavori e dall' Impresa appaltatrice. Tali verbali dovranno essere tenuti in cantiere e potranno contenere disposizioni o procedure particolari, concordate tra le parti, inerenti la cronologia delle diverse fasi lavorative.

L'Impresa dovrà informare il Direttore dei Lavori di ogni cambiamento di fase lavorativa prevista.

Ad integrazione e specifica del presente documento l'Impresa prima dell'inizio dei lavori deve presentare alla Direzione Lavori il programma dei tempi e dei modi di esecuzione delle opere appaltate in rapporto ai termini contrattuali ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010 e ai sensi dell'articolo 19 del Capitolato Speciale di Appalto. Il cronoprogramma farà parte dei documenti contrattuali.

Spilimbergo, agosto 2018

Il Progettista

(Dott. Ing. Pierino Truant)

settimane
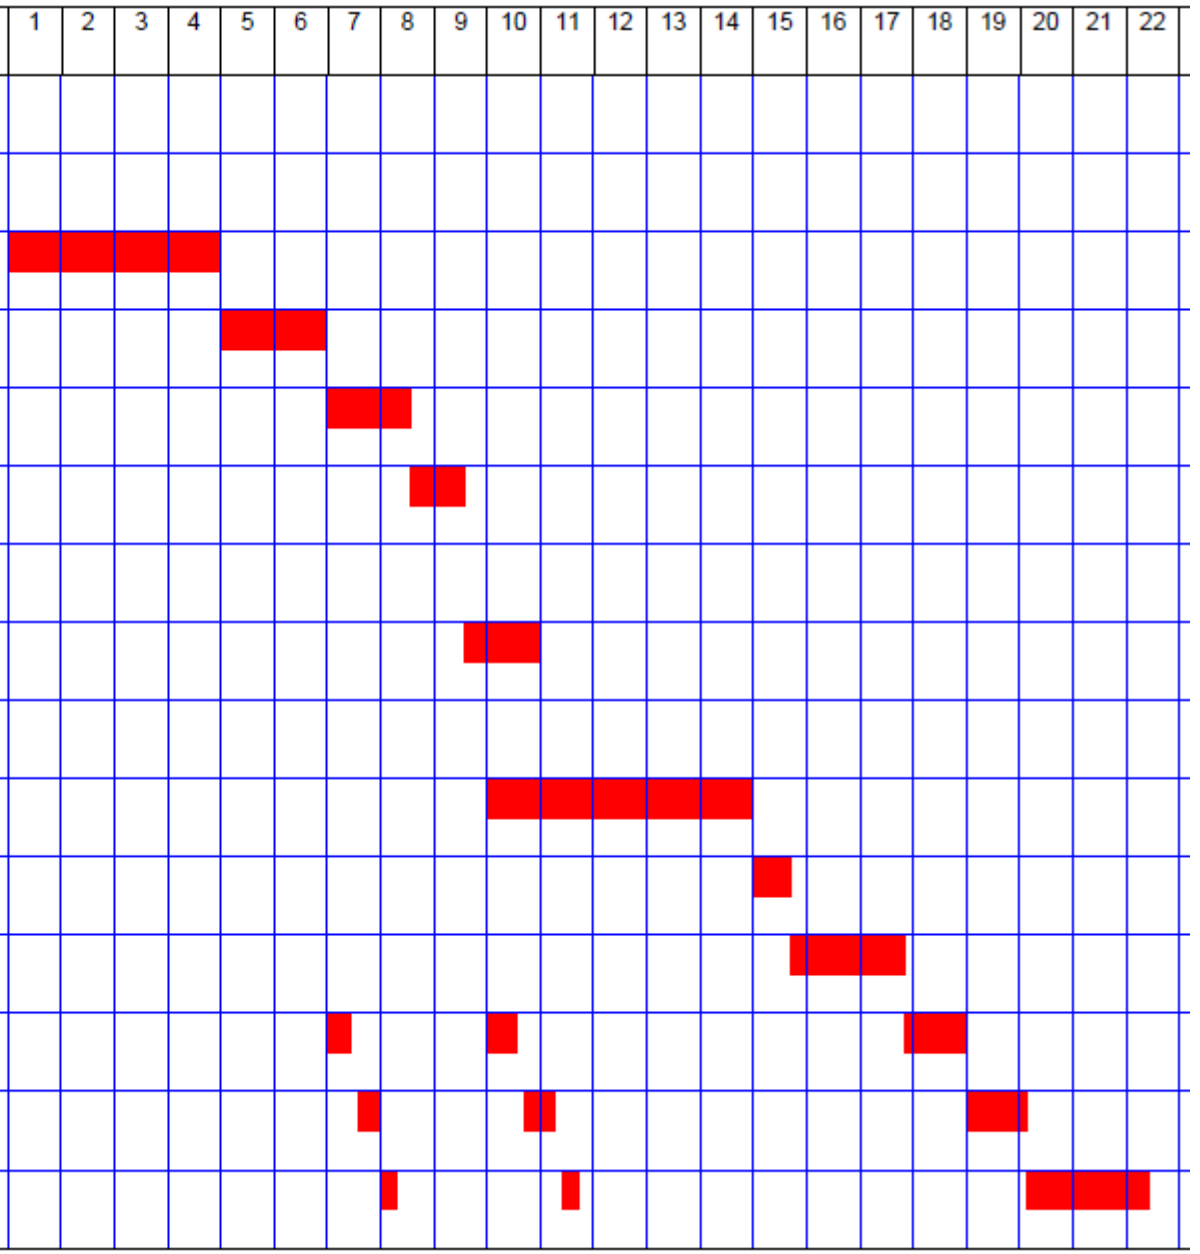
ID	Nome	Durata (g): 150,00
1	Fasi di lavoro	
2	F.01 - OPERE EDILI	
3	F.01.01 - Realizzazione reti tecnologiche area esterna edificio	28,00
4	F.01.02 - Realizzazione fondazioni nuova scala in ferro	14,00
5	F.01.03 - Realizzazione isolamenti e massetti	11,00
6	F.01.04 - Posa in opera pavimenti	7,00
7	F.02 - OPERE STRUTTURALI	
8	F.02.01 - Realizzazione scala in ferro	10,00
9	F.03 - OPERE DI FINITURA	
10	F.03.01 - Posa cartongessi	35,00
11	F.03.02 - Tintegguature	5,00
12	F.04 - SERRAMENTI	15,00
13	F.05 - IMPIANTO IDRICO E SANITARIO	15,00
14	F.06 - IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO	15,00
15	F.07 - IMPIANTO ELETTRICO	20,00
